

Information om arbeten för Gasklocka 3 och 4

Höst 2026



Inför byggandet av bostadshuset Stadsljus spränger Stockholms stad ut för garage om två våningar samt för byggnadens källarvåningar. Sprängningarna startade i april 2026 och kommer pågå till november i år. Stadsljus kommer totalt att rymma cirka 360 lägenheter och beräknas stå klart 2029.

Containerväggen på berget tas bort

Containerväggen uppe på berget som har fungerat som ett bullerskydd är sedan förra borta. För att minska bullernivåerna har vi även vidtagit åtgärder som utökad täckning med sprängmattor och fiberduk samt mindre sprängsalvor. Precis som vid förskolan Anna har numera även förskolan Björnlandet en person på plats vid sprängning som ser till så att alla barnen är inomhus när en sprängsalva går.

Att containerväggen togs bort för att vi ska kunna slutföra schaktarbetena.

Tack för ert tålamod!

Pågående arbeten hösten 2026

- Borrning av berg inför bergsprängning sker löpande.
- Sprängning utförs löpande utifrån sprängtiderna 10, 12, 14 och 18.
- Avtäckning av berg, vilket innebär schakt av jordmassor och rengöring av bergyta, sker löpande.
- Utlastning berg fortsätter. Sprängt berg körs på lastbil från arbetsplatsen till masslogistikcenter.
- Vi vattnar för att minska dammspridning.
- Sprängningsarbetet beräknas vara klart i november 2026.
- Vi vill också påminna om att inte stå vid ett öppet fönster och titta på sprängningarna.

Hittills har vi sprängt bort 70 000 av totalt cirka 115 000 ton berg

Klockolja i berget enligt förväntan



Under sommaren nådde vi de delar av berget där vi förväntat oss hitta mindre mängder klockolja, som tidigare användes för att tätas plåtgasklockan. Över åren har oljan, som består av stenkolstjära, sakta läckt ner i sprickor i berget. Redan 2018 tog vi bort merparten av klockoljan. De mängder vi nu hittat är i linje med våra förväntningar, och vi har inte märkt någon ökad lukt även under de varmare sommarperioderna.

Med anledning av detta har vi mätt halterna av flyktiga föroreningar i luften och resultatet visar att de ligger långt under de arbetsmiljögränsvärden som används för att skydda vuxna personer med återkommande exponering. Dessa arbetsmiljögränsvärden är framtagna för vuxna personer som vistas i miljön 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan, under ett arbetsliv.

Den förorenade sprängstenen sorteras på plats. Rena massor går direkt till kross för att återanvändas. Förorenade stenar hanteras olika beroende på storlek, de mindre går till deponi, medan de större körs till en mellanlagringsyta i Södra Värtahamnen där de tvättas och renas. De rengjorda stenarna transporteras därefter till projektets masslogistikcenter för krossning.

Bilderna visar exempel på stenar med klockolja på.

Information

Arbetstider:

Våra ordinarie arbetstider är måndag-fredag kl. 07-19.

Fasta sprängtider:

Sprängningar får ske på följande fasta tider kl. 10, 12, 14 och 18.

Alla tider kommer inte alltid att utnyttjas. Prenumerera på sms-avisering om du vill vara förberedd på sprängning.

SMS-avisering för sprängningar:

Anmäl dig till SMS-avisering här: [Anmälan sms-avisering](#)


Flaggvakter:

Flaggvakter finns på plats för att göra passagen på vägen så säker som möjligt.

Webb:

[Sprängningsarbeten inför byggandet av Stadsljus](#)
[Norra Djurgårdsstaden](#)

Arbetsområdet

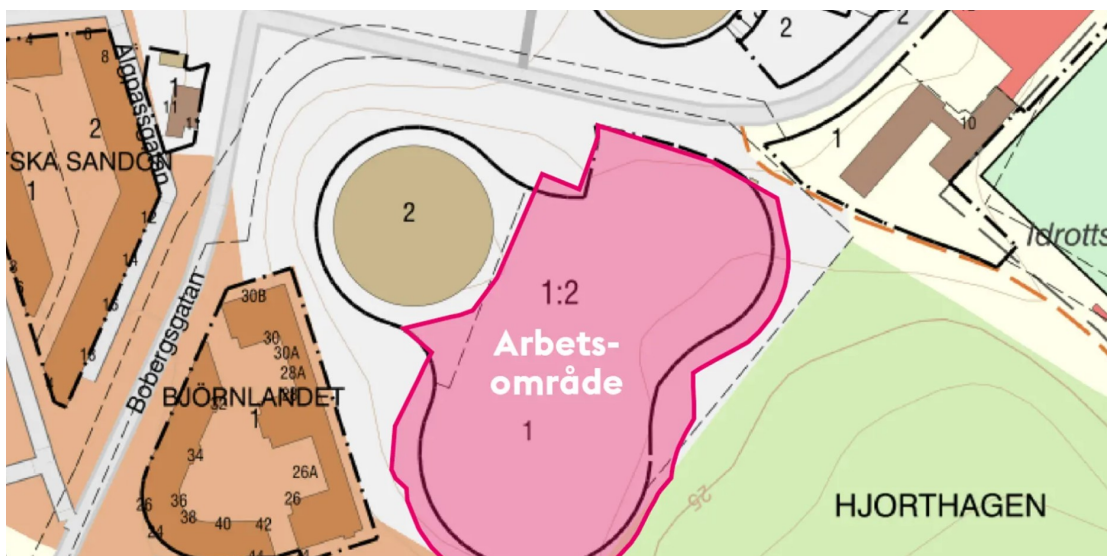

Nedan bild visar vilket område som kan påverkas av våra arbeten



- Den innersta cirkeln (1:2) visar arbetsområdet
- Den inre streckade cirkeln är riskområde
- Den yttre streckade cirkeln är inventeringsområde

Om utskicket

Vi skickar löpande under byggperioden ut detta informationsutskick, som en kanal för att berätta om vad som händer på bygget. Det går ut till dig som är boende eller har verksamhet i området och som har anmält dig till utskicket.

Kontakta oss

E-post: norradjurgardsstaden@stockholm.se

Telefon: 08-508 26 433
