Prel huvudtidplan Kista Äng 2021-06-18

ID	Aktivitetsl.	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut
1		**KISTA ÄNG**			
2		***Prel huvudtidplan***			
3					
4		**Genomförandebeslut**			
5		Exploateringsnämnden	0 dagar	to 20-12-17	to 20-12-17
6		Kommunfullmäktige	0 dagar	må 21-02-15	må 21-02-15
7		Laga Kraft	0 dagar	må 21-02-15	må 21-02-15
8					
9		**Upphandling Stadens Entreprenader**			
10		Förberedande arbeten	76 dagar	fr 20-11-13	fr 21-02-26
11		KC-pelare	101 dagar	må 21-01-11	må 21-05-31
12		Uppfyllnad överlast, arbetsgator och ledningar	50 dagar	on 22-03-23	ti 22-05-31
13		Finplanering	50 dagar	må 24-03-25	fr 24-05-31
14					
15		**Stockholm Stad, förberedande arbeten**			
16		Allmän mark	347 dagar	to 21-04-01	fr 22-07-29
17		Trafikomläggning	347 dagar	to 21-04-01	fr 22-07-29
18		Ledningsomläggning	197 dagar	to 21-04-01	fr 21-12-31
19		Bredning av Torshamnsgatan	347 dagar	to 21-04-01	fr 22-07-29
20		Skalskydd	197 dagar	to 21-04-01	fr 21-12-31
21		Arbetsbädd för kc etapp 1	22 dagar	to 21-04-01	fr 21-04-30
22		Arbetsbädd för kc etapp 2	40 dagar	må 21-05-03	fr 21-06-25
23		Arbetsbädd för kc etapp 3	60 dagar	må 21-08-09	fr 21-10-29
24					
25		**Etapp 1 kv 2, 3 och 4, Stadens arbeten**			
26		Kc-pelare	152 dagar	ti 21-06-01	on 21-12-29
27		Uppfyllning t.o.m överlast (1 m över F.M)	44 dagar	må 23-01-02	to 23-03-02
28		Liggtid överlast	196 dagar	fr 23-03-03	fr 23-12-01
29		Arbetsgator och ledningar	261 dagar	må 23-12-04	må 24-12-02
30		Finplanering	318 dagar	ti 24-12-03	to 26-02-19
31					
32		Kvartersmark, Exploatörens arbeten			
33		Byggstart enligt Exploateringsavtal	0 dagar	må 22-01-03	må 22-01-03
34		Grundläggnind samt källarvåning	261 dagar	må 22-01-03	fr 22-12-30
35		Vitesbelagd milstolpe enligt Exploateringsavtal	0 dagar	må 23-01-02	må 23-01-02
36		Husbyggnation	522 dagar	må 23-01-02	ti 24-12-31
37		Start inflyttning	0 dagar	ti 24-12-31	ti 24-12-31
38					
39					

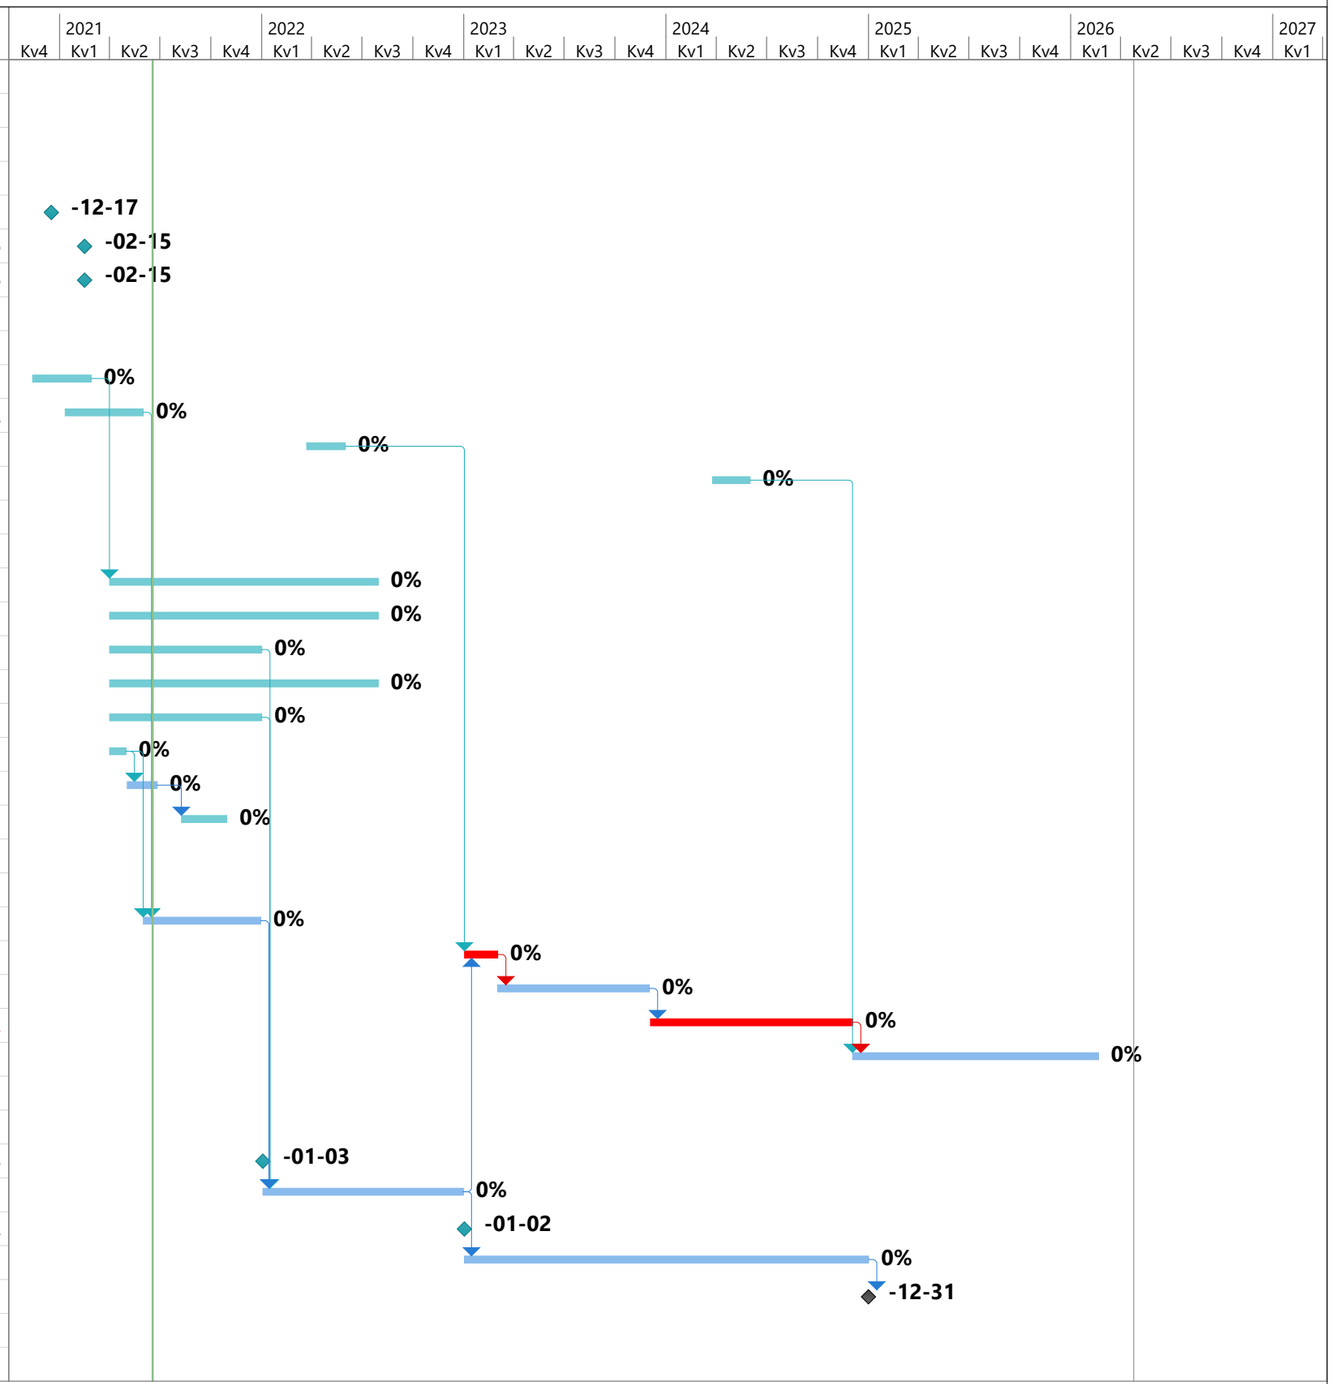

Kritisk	Aktivitetsstatus	Originalplan	Sammanfattning	Inaktiv aktivitet
Kritisk delning	Manuell aktivitet	Delning av originalplan	Manuell sammanfattning	Inaktiv milstolpe
Kritisk status	Endast start	Originalmilstolpe	Projektsammanfattning	Inaktiv sammanfattning
Aktivitet	Endast slutdatum	Milstolpe	Externa aktiviteter	Måldatum
Delad	Endast varaktighet	Sammanfattningsstatus	Extern milstolpe	

Röd aktivitet betyder att byggherren inte har tillgång till gatumark (lokalgata) pga stadens arbete.

Prel huvudtidplan Kista Äng 2021-06-18

ID	Aktivitetsl.	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut
40		**Etapp 2 kv 1,5, 6, 7, 8 och 9, Stadens arbeten**			
41		Kc-pelare	173 dagar	on 21-12-01	fr 22-07-29
42		Uppfyllning t.o.m överlast (1 m över F.M)	44 dagar	ti 23-08-01	fr 23-09-29
43		Liggtid överlast	196 dagar	må 23-10-02	må 24-07-01
44		Arbetsgator och ledningar	220 dagar	ti 24-07-02	må 25-05-05
45		Finplanering	254 dagar	ti 25-05-06	fr 26-04-24
46					
47		Kvartersmark, Exploatörens arbeten			
48		Byggstart enligt Exploateringsavtal	0 dagar	må 22-08-01	må 22-08-01
49		Grundläggnind samt källarvåning	261 dagar	må 22-08-01	må 23-07-31
50		Husbyggnation	540 dagar	ti 23-08-01	må 25-08-25
51		Start inflyttning	0 dagar	to 25-09-25	to 25-09-25

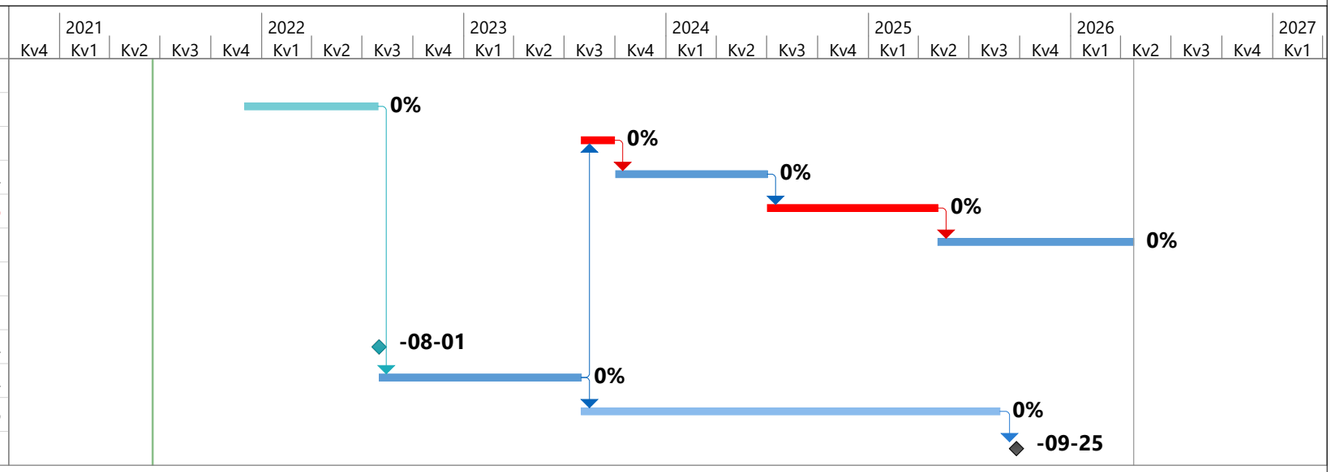

Kritisk	Aktivitetsstatus	Originalplan	Sammanfattning	Inaktiv aktivitet
Kritisk delning	Manuell aktivitet	Delning av originalplan	Manuell sammanfattning	Inaktiv milstolpe
Kritisk status	Endast start	Originalmilstolpe	Projektsammanfattning	Inaktiv sammanfattning
Aktivitet	Endast slutdatum	Milstolpe	Externa aktiviteter	Måldatum
Delad	Endast varaktighet	Sammanfattningsstatus	Extern milstolpe	

Röd aktivitet betyder att byggherren inte har tillgång till gatumark (lokalgata) pga stadens arbete.
